BYTEALL COMPANY

www.byteall.com



PROPOSAL
KHARISMART

APLIKASI PENCATATAN HARGA DAN STOK TOKO KHARISMA

Untuk
Yth. Ibu Sumarti

Owner Toko Kharisma

Dari
Bandar Qaid

CEO Byteall Company

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun proposal proyek berjudul “Aplikasi Kharismart, Pencatatan Harga dan Stok untuk Toko Kharisma”.

Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, serta sebagai rancangan proyek pengembangan sistem informasi yang dapat membantu Toko Kharisma dalam mengelola harga, stok, dan keuangan secara efektif dan efisien.

Kami berharap proposal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan panduan dalam pelaksanaan proyek ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang.
B. Rumusan Masalah.
C. Tujuan Proyek.
D. Manfaat Proyek.
BAB II
METODE MANAJEMEN PROYEK.
A. Initiating Process.
B. Planning Process.
C. Executing Process.
D. Monitoring and Controlling Process.
BAB III
MANAJEMEN DAN PERENCANAAN PROYEK.
A. Manajemen Stakeholder dan Tim Proyek.
B. Manajemen Ruang Lingkup Proyek
C. Manajemen Jadwal Proyek.
D. Manajemen Biaya Proyek.
E. Manajemen Risiko Proyek.
F. Penerapan Standar ISO.
BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROYEK.
A. Gambaran Umum dan Pengembangan Sistem.
B. Pengujian Sistem.
C. Monitoring dan Evaluasi Proyek
D. Serah Terima Proyek
BAB V
PENUTUP.
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA.

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut setiap badan usaha untuk mengoptimalkan pengelolaan data operasional harian melalui sistem berbasis web yang terstruktur dan terkomputerisasi. Kharismart memerlukan sebuah sistem manajemen internal yang andal untuk membantu Pemilik (Owner) yang bertindak langsung sebagai Administrator (Admin) dalam mengontrol data operasional, pencatatan transaksi, pengelolaan stok, serta penyusunan laporan keuangan/operasional secara akurat dan mandiri.

Selama ini, pengelolaan operasional internal yang masih dilakukan secara manual atau semi-digital rawan menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian data stok, lamanya proses rekapitulasi laporan, serta tingginya potensi kesalahan pencatatan (human error).

Menjawab kebutuhan internal tersebut, perusahaan kami menawarkan solusi pengembangan aplikasi web Kharismart khusus internal. Aplikasi ini dirancang secara terpusat dan aman khusus untuk pengguna tunggal (Owner sebagai Admin), sehingga memudahkan pemantauan serta pengelolaan seluruh aktivitas bisnis secara real-time dan efisien.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tahapan Initiating, Planning, Executing, serta Monitoring and Controlling yang diterapkan dalam proyek pengembangan sistem internal Kharismart?
2. Bagaimana menentukan ruang lingkup internal, estimasi biaya berbasis bottom-up estimating secara terperinci (dari tugas/modul terkecil ke terbesar), serta jadwal pengerjaan proyek bagi Kharismart?
3. Bagaimana strategi pengelolaan pemangku kepentingan (stakeholder), struktur tim, mitigasi risiko, serta penerapan standar ISO yang relevan untuk menjamin keamanan dan mutu sistem manajemen Kharismart?
4. Bagaimana proses pelaksanaan, pengujian sistem, evaluasi berkala, hingga serah terima aplikasi web kepada Pemilik dan Admin Kharismart dilakukan?

C. TUJUAN PROYEK

1. Menerapkan metodologi manajemen proyek yang profesional dari tahap inisiasi hingga serah terima sistem kepada Kharismart.
2. Membangun aplikasi web manajemen internal Kharismart yang aman, terintegrasi, dan mudah dioperasikan oleh Pemilik dan Administrator.
3. Menyusun penawaran anggaran biaya proyek secara akurat menggunakan metode bottom-up estimating yang dihitung dari rincian tugas terendah, diurutkan dari nominal terkecil hingga terbesar.
4. Menjamin keamanan data operasional internal melalui pengontrolan hak akses terstruktur dan acuan standar ISO yang relevan.
5. Menyerahkan hasil akhir aplikasi beserta dokumentasi teknis dan pelatihan pengoperasian bagi Admin Kharismart.

D. MANFAAT PROYEK

1. Bagi Pemilik sekaligus Administrator Kharismart (Owner/Admin): Memudahkan pemantauan seluruh aktivitas operasional bisnis, mengelola pencatatan data harian dan stok barang secara langsung, melihat ringkasan grafik/dashboard performa, serta memperoleh laporan rekapitulasi otomatis yang akurat dalam satu antarmuka terintegrasi.
2. Bagi Perusahaan Pengembang: Menjadi wujud nyata portofolio kerja sama profesional dalam memberikan solusi perangkat lunak manajemen internal berbasis web yang aman dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna tunggal.

BAB II
METODE MANAJEMEN PROYEK

A. INITIATING PROCESS (INISIASI PROYEK)

Tahap inisiasi merupakan langkah awal kerja sama antara perusahaan kami dan Kharismart. Pada tahap ini, kami mengadakan diskusi bersama Pemilik Kharismart untuk memetakan alur kerja internal, menetapkan otorisasi dan kontrol hak akses pengguna tunggal (Owner sebagai Admin), merumuskan batas ruang lingkup, serta menyusunkannya ke dalam dokumen piagam proyek (project charter).

B. PLANNING PROCESS (PERENCANAAN PROYEK)

1. Tahap perencanaan disusun secara matang oleh tim kami sebelum proses pengkodean dimulai. Hal ini mencakup:
2. Penyusunan Work Breakdown Structure (WBS) khusus modul pengawasan & administrasi internal.
3. Perhitungan estimasi anggaran penawaran menggunakan metode bottom-up estimating yang menghitung rincian biaya dari paket kerja paling bawah lalu dijumlahkan, diurutkan dari nominal terkecil hingga terbesar.
4. Penyusunan lini masa (timeline) pengerjaan proyek berdurasi 8 minggu.
5. Perencanaan manajemen risiko, keamanan data login, serta acuan standar kualitas ISO.

C. EXECUTING PROCESS (EKSEKUSI PROYEK)

Tahap eksekusi adalah tahapan implementasi teknis di mana tim pengembang mewujudkan perencanaan ke dalam bentuk produk aplikasi web internal Kharismart. Kegiatannya meliputi perancangan tata letak dashboard admin/owner, pembuatan struktur basis data MySQL, pengkodean logika bisnis internal (backend & frontend), hingga penyusunan buku panduan penggunaan bagi admin.

D. MONITORING AND CONTROLLING PROCESS (MONITORING DAN PENGENDALIAN)

Tahap ini berjalan secara kontinu selama masa proyek berlangsung. Manajer proyek secara berkala memantau kesesuaian progres pengerjaan terhadap jadwal, mengendalikan penggunaan anggaran, menguji pembatasan hak akses sistem internal, serta melaporkan perkembangan secara transparan kepada Pemilik Kharismart.

BAB III
MANAJEMEN DAN PERENCANAAN PROYEK

A. MANAJEMEN STAKEHOLDER DAN TIM PROYEK

1. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER

- Pemilik sekaligus Administrator Kharismart (Owner/Admin): Pengambil keputusan utama sekaligus pengguna tunggal (single-user) yang bertindak sebagai operator harian untuk menginput, mengedit, dan mengelola data operasional, serta meninjau dashboard eksekutif dan laporan bisnis pada sistem web.
- Project Manager & Tim Pengembang: Bertanggung jawab membangun aplikasi web internal sesuai spesifikasi dan tenggat waktu.

2. STRUKTUR TIM PROYEK



Bandar Qoid
CEO

Bertanggung jawab atas koordinasi tim, pengambilan keputusan, dan pengawasan keseluruhan proyek.

@bandarqoid



Gizha Dwi Arin
SYSTEM ANALYST

Bertanggung jawab menganalisis permasalahan pengguna, mengidentifikasi kebutuhan sistem, serta menyusun spesifikasi dan alur kerja sistem.

@gizhaarin



Anisa Eka Suraya
UI/UX DESIGNER

Bertanggung jawab merancang antarmuka, pengalaman pengguna, wireframe, dan prototype aplikasi.

@anisaeka



Syaharani Dwi
MOBILE APP DEVELOPER

Bertanggung jawab mengembangkan aplikasi mobile berdasarkan rancangan dan spesifikasi sistem.

@syaharanidwi



Setia Sirajan
QA/DOCUMENTATION

Bertanggung jawab melakukan pengujian sistem, mencatat hasil pengujian, serta menyusun manual book dan dokumentasi proyek.

@setiasirajan

B. MANAJEMEN RUANG LINGKUP PROYEK

Manajemen ruang lingkup proyek merupakan proses untuk menentukan, merencanakan, dan mengendalikan pekerjaan yang diperlukan agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada proyek Kharismart, ruang lingkup ditetapkan berdasarkan kebutuhan Toko Kharisma dalam mengelola data barang, harga, stok, dan informasi operasional melalui aplikasi.
Manajemen ruang lingkup proyek Kharismart meliputi enam proses berikut.

1. PLAN SCOPE MANAGEMENT

Tahap ini bertujuan untuk menentukan bagaimana ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan. Tim Byteall Company menyusun rencana pengelolaan ruang lingkup berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik Toko Kharisma.
Perencanaan ini digunakan sebagai pedoman agar pengembangan aplikasi tetap berfokus pada kebutuhan yang telah disepakati.

2. COLLECT REQUIREMENTS

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan kebutuhan pengguna melalui diskusi dan identifikasi permasalahan operasional Toko Kharisma.
Kebutuhan yang diidentifikasi meliputi:

- Pengelolaan data barang.
- Pencatatan dan pembaruan harga barang.
- Pencatatan dan pemantauan stok barang.
- Pengelolaan data operasional oleh administrator.
- Penyajian informasi dan laporan bagi pemilik toko.

Hasil tahap ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan fitur yang akan dikembangkan.

3. DEFINE SCOPE

Tahap ini bertujuan untuk menetapkan batasan pekerjaan dan hasil yang akan dihasilkan oleh proyek. Ruang lingkup aplikasi Kharismart meliputi:

- Pengembangan aplikasi untuk kebutuhan internal Toko Kharisma.
- Pengelolaan data barang, harga, dan stok.
- Pengaturan otorisasi terpusat untuk pengguna tunggal (Owner sebagai Admin).
- Penyajian dashboard dan informasi operasional harian yang terintegrasi.
- Penyusunan dokumentasi serta panduan penggunaan aplikasi.

Pengembangan fitur tambahan di luar kebutuhan yang telah disepakati harus melalui pembahasan dan persetujuan bersama.

4. CREATE WBS

WBS merupakan proses membagi pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah direncanakan, dilaksanakan, dan dipantau.

Pembagian pekerjaan proyek Kharismart adalah sebagai berikut.

No.	Paket Pekerjaan	Rincian Aktivitas
1	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna tunggal (Owner/Admin).
2	Desain Sistem	Merancang antarmuka, alur sistem, dan basis data.
3	Pengembangan Sistem	Membuat fitur pengelolaan barang, harga, dan stok.
4	Pengembangan Dashboard	Membuat tampilan informasi dan laporan terintegrasi untuk Owner/Admin.
5	Pengujian Sistem	Menguji fungsi aplikasi dan verifikasi keamanan hak akses pengguna.
6	Implementasi	Menerapkan sistem sesuai rencana proyek.
7	Dokumentasi dan Pelatihan	Menyusun *manual book* dan memberikan pelatihan penggunaan.
8	Serah Terima	Menyerahkan aplikasi dan dokumentasi kepada pihak Toko Kharisma.

Pembagian pekerjaan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan jadwal dan estimasi biaya proyek.

5. VALIDATE SCOPE

Validasi ruang lingkup dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan telah sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
Pada proyek Kharismart, tim Byteall Company akan mendemonstrasikan fitur yang telah selesai kepada pemilik toko. Pemilik toko kemudian meninjau kesesuaian fungsi aplikasi, seperti pengelolaan barang, pembaruan harga, pemantauan stok, dan tampilan laporan.
Apabila hasil pekerjaan telah sesuai dengan persyaratan yang disepakati, hasil tersebut dapat diterima oleh pemilik toko.

6. CONTROL SCOPE


Pengendalian ruang lingkup dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan kebutuhan tidak mengganggu jadwal, biaya, dan target penyelesaian proyek.
Apabila terdapat permintaan fitur tambahan dari pihak Toko Kharisma, tim Byteall Company akan mengevaluasi dampaknya terhadap waktu pengerjaan, biaya, dan sumber daya. Perubahan hanya dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak terkait.
Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya scope creep, yaitu meluasnya ruang lingkup pekerjaan tanpa pengendalian yang memadai.

C. MANAJEMEN JADWAL PROYEK

Proyek pengembangan aplikasi web manajemen internal Kharismart dijadwalkan berlangsung selama 8 minggu (40 hari kerja). Pemantauan dan visualisasi jadwal dilakukan menggunakan Gantt Chart (Bar) untuk memudahkan pelacakan kemajuan proyek dari waktu ke waktu.

Berikut adalah tabel Rincian Aktivitas dan Lini Masa Proyek (40 Hari Kerja / 8 Minggu) yang rapi dan terstruktur:

Kode	Aktivitas Proyek	Rentang Waktu (Minggu / Hari)	Durasi
A	Analisis Kebutuhan Internal: Pertemuan awal, wawancara alur kerja Kharismart, dan penyusunan spesifikasi sistem	Minggu 1 (Hari 1–5)	5 Hari
B	Desain Sistem & UI/UX: Pembuatan tata letak antarmuka dashboard Admin/Owner dan *wireframing*	Minggu 2 (Hari 6–10)	5 Hari
C	Pengadaan & Instalasi Perangkat: Konfigurasi server uji coba (*staging server*), repositori kode, dan lingkungan sistem	Minggu 3 (Hari 11–15)	5 Hari
D	Pembuatan Database: Perancangan skema basis data MySQL dan tabel otorisasi Owner/Admin	Minggu 4 (Hari 16–20)	5 Hari
E	Pemrograman Modul Utama: Pengkodean logika *backend*, *frontend*, manajemen stok, dan laporan	Minggu 5–6 (Hari 21–30)	10 Hari
F	Integrasi & Uji Coba: Pengujian fungsionalitas (*black-box testing*), otentikasi hak akses, dan *debugging*	Minggu 7 (Hari 31–35)	5 Hari
G	Implementasi & Pelatihan: Pelatihan pengoperasian sistem bagi Admin/Owner serta serah terima proyek	Minggu 8 (Hari 36–40)	5 Hari
TOTAL	Durasi Total Proyek	Minggu 1–8 (Hari 1–40)	40 Hari

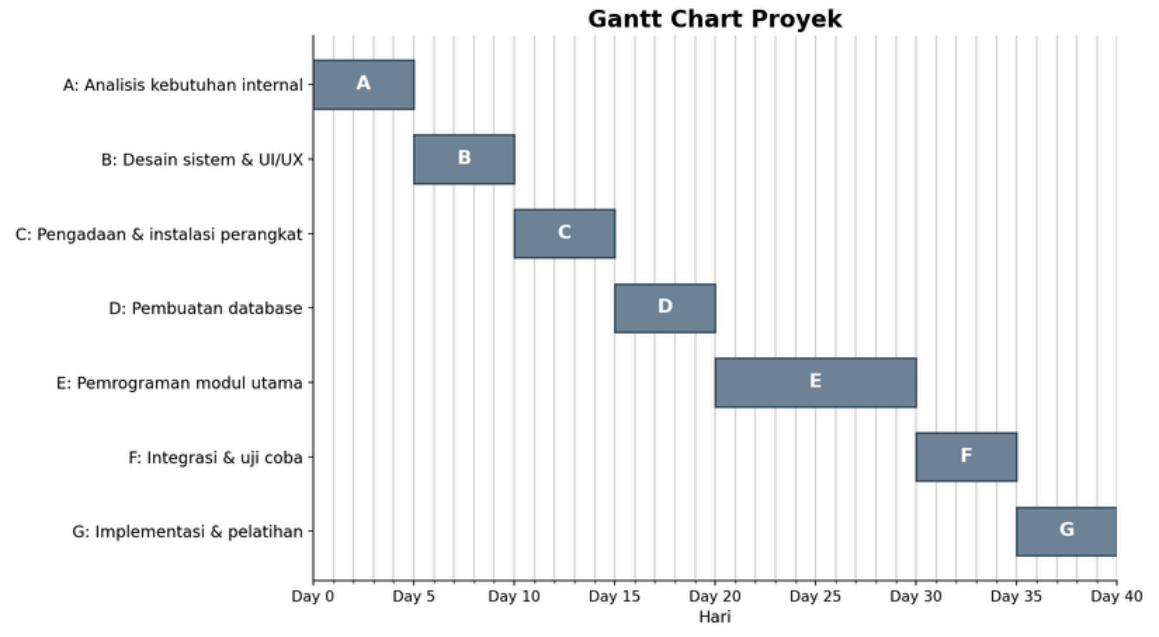

*Gambar Gantt Chart (Bar)

D. MANAJEMEN BIAYA PROYEK (BOTTOM-UP ESTIMATING)

Estimasi anggaran penawaran disusun menggunakan pendekatan Bottom-Up Estimating (menghitung estimasi biaya dari tingkat pekerjaan terkecil/WBS level terendah, kemudian diakumulasikan ke level atas), yang diurutkan secara terperinci dari komponen biaya terkecil hingga terbesar:

No.	Kode WBS	Paket Kerja / Rincian Pekerjaan (Level Terendah)	Sumber Daya / Keterangan	Estimasi Biaya (Rp)
1	WBS 5.2	Penyusunan Dokumentasi Teknis & Panduan Operasional (*User Manual*)	Cetak & penyusunan buku panduan penggunaan bagi Owner/Admin	Rp300.000
2	WBS 1.3	Infrastruktur Operasional & Komunikasi Tim	Kuota data/internet, utilitas, dan sarana koordinasi internal tim pengembang	Rp400.000
3	WBS 5.1	Sesi Pelatihan Pengoperasian Sistem (*User Training*)	Pendampingan & pelatihan pengoperasian sistem khusus bagi Owner/Admin Kharismart	Rp500.000
4	WBS 3.4	Pengadaan Server Uji Coba (*Staging Server*) & Repositori System	Biaya pendaftaran domain uji coba & hosting *staging server* selama tahap pengerjaan	Rp600.000
5	WBS 4.1	Pengujian Fungsi (*Black-Box Testing*), Keamanan Otentikasi, & QA	Evaluasi fitur, *security testing* otentikasi hak akses Owner/Admin, & perbaikan *bug*	Rp1.500.000
6	WBS 2.2	Desain UI/UX Panel Owner/Admin & Perancangan Basis Data MySQL	Pembuatan tata letak antarmuka dashboard, rancangan skema database, dan *wireframing*	Rp1.500.000
7	WBS 1.1	Analisis Alur Kerja Operasional Internal & Manajemen Proyek	Wawancara analisis alur kerja Kharismart, penyusunan spesifikasi sistem, & koordinasi proyek	Rp2.000.000
8	WBS 3.1	Pengembangan Modul Utama Aplikasi Web (*Coding & Single-User Access Integration*)	Pengkodean logika *backend*, *frontend*, integrasi hak akses Owner/Admin, & laporan	Rp5.000.000
		SUBTOTAL BIAYA LANGSUNG PROYEK (Hasil Penjumlahan Bottom-Up)		Rp11.800.000
9	WBS 6.1	Cadangan Risiko (*Contingency Reserve*)	Dana cadangan penanganan potensi risiko teknis (10% dari Subtotal)	Rp1.180.000
		TOTAL ESTIMASI BIAYA PENAWARAN PROYEK		Rp12.980.000

Catatan:
Pendekatan Bottom-Up Estimating menjamin setiap fitur pengelolaan internal diperhitungkan secara akurat sesuai porsi pekerjaannya.

E. MANAJEMEN RISIKO PROYEK

1. Risiko Operasional dan Keamanan Sistem: Ancaman utama pada kategori ini meliputi potensi kebocoran data internal Kharismart/kredensial akibat celah keamanan, serta terjadinya waktu henti sistem (downtime) maupun kehilangan data akibat gangguan server. Risiko ini dimitigasi dengan menerapkan kontrol akses berbasis peran tunggal (least privilege untuk akun terautentikasi Owner/Admin), enkripsi data, evaluasi kode berkala, pencadangan otomatis (automated backup) lintas region cloud, serta penyusunan rencana pemulihan bencana (Disaster Recovery Plan) dan pemantauan server 24/7.
2. Risiko Proyek dan Kualitas Produk: Risiko ini mencakup pergeseran ruang lingkup (scope creep) akibat permintaan fitur tambahan di luar kesepakatan yang dapat memicu pembengkakan anggaran dan keterlambatan jadwal, serta adanya cacat perangkat lunak (bugs/errors) saat aplikasi dirilis. Mitigasi dilakukan melalui penandatanganan dokumen spesifikasi kebutuhan sistem (Software Requirements Specification) dan prosedur formal Change Request Order di awal, serta penerapan pengujian bertahap (unit testing, integrasi, dan User Acceptance Testing) oleh tim Quality Assurance.
3. Risiko Sumber Daya Manusia (SDM): Potensi kendala timbul dari ketergantungan pengetahuan personal (key-person dependency) saat teknisi utama berhalangan, serta tingginya perputaran talenta TI (talent attrition) yang dapat memperlambat progres pengerjaan. Mitigasi dilakukan dengan menerapkan standardisasi clean code, dokumentasi terpusat, repositori pengetahuan internal, sesi transfer pengetahuan berkala antardivisi, pembagian beban kerja yang terukur, serta jalur karier yang jelas agar pengembang baru dapat beradaptasi dengan cepat.
4. Risiko Legal dan Kepatuhan Kontrak: Risiko ini melibatkan potensi sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan kerahasiaan kode sumber antara perusahaan dengan klien, serta ketidaksesuaian regulasi perlindungan data pribadi. Langkah mitigasi yang diterapkan adalah penyusunan klausul Non-Disclosure Agreement (NDA) dan kontrak kerja sama legal yang tegas mengenai hak cipta serta lisensi, disertai penyelarasan tata kelola data operasional internal Kharismart dengan regulasi perlindungan data yang berlaku dan standar kepatuhan keamanan informasi.

F. PENERAPAN STANDAR ISO

1. ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu): Standar utama dan paling mendasar untuk memastikan seluruh proses bisnis, mulai dari perencanaan, pengembangan perangkat lunak, hingga penyerahan solusi ke klien, berjalan konsisten serta memenuhi kepuasan pelanggan.
2. ISO/IEC 27001:2022 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi): Sangat penting bagi perusahaan teknologi guna menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data klien, terutama terkait integrasi sistem, pengelolaan data pribadi, dan infrastruktur cloud.
3. ISO/IEC 20000-1:2018 (Sistem Manajemen Layanan TI): Standar yang tepat untuk menjamin profesionalisme dan efektivitas dalam pengelolaan operasional TI, pemeliharaan sistem berkala, serta penanganan kendala teknis pascaimplementasi.
4. ISO/IEC 25010 (Standar Kualitas Produk Perangkat Lunak): Acuan teknis untuk mengevaluasi fungsionalitas, keandalan, efisiensi kinerja, dan kemudahan penggunaan (usability) dari aplikasi yang dikembangkan.





CERTIFICATE

Lembaga Sertifikasi Simulasi (Fiktif) - Untuk Keperluan Tugas

This is to certify that the management system of

PT BYTEALL

(Perusahaan Simulasi untuk Tugas)

has been assessed and found to be in compliance with the requirements of

ISO 9001:2015

Quality Management Systems

Sistem Manajemen Mutu

Scope / Ruang Lingkup:

Penyediaan solusi teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak, dan layanan pendukung

ISSUE DATE	SURVEILLANCE 1	SURVEILLANCE 2	EXPIRED DATE
26-09-2024	26-09-2025	26-09-2026	26-09-2027

Management Systems Division - Director

(tanda tangan fiktif)

Certificate Number: SIM-QMS-0001 (nomor fiktif)

DOKUMEN SIMULASI UNTUK TUGAS/PEMBELAJARAN. Bukan sertifikat resmi, tidak diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi, dan tidak boleh digunakan untuk tender, klien, atau klaim sertifikasi.

Dipindai dengan CamScanner



CERTIFICATE

Lembaga Sertifikasi Simulasi (Fiktif) - Untuk Keperluan Tugas

This is to certify that the management system of

PT BYTEALL

(Perusahaan Simulasi untuk Tugas)

has been assessed and found to be in compliance with the requirements of

ISO/IEC 27001:2022

Information Security Management Systems

Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Scope / Ruang Lingkup:

Penyediaan solusi teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak, dan layanan pendukung

ISSUE DATE	SURVEILLANCE 1	SURVEILLANCE 2	EXPIRED DATE
26-09-2024	26-09-2025	26-09-2026	26-09-2027

Management Systems Division - Director

(tanda tangan fiktif)

Certificate Number: SIM-ISMS-0002 (nomor fiktif)

DOKUMEN SIMULASI UNTUK TUGAS/PEMBELAJARAN. Bukan sertifikat resmi, tidak diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi, dan tidak boleh digunakan untuk tender, klien, atau klaim sertifikasi.

Dipindai dengan CamScanner



CERTIFICATE

Lembaga Sertifikasi Simulasi (Fiktif) - Untuk Keperluan Tugas

This is to certify that the management system of

PT BYTEALL

(Perusahaan Simulasi untuk Tugas)

has been assessed and found to be in compliance with the requirements of

ISO/IEC 20000-1:2018

IT Service Management Systems

Sistem Manajemen Layanan TI

Scope / Ruang Lingkup:

Penyediaan dan pengelolaan layanan teknologi informasi serta dukungan pelanggan

ISSUE DATE	SURVEILLANCE 1	SURVEILLANCE 2	EXPIRED DATE
26-09-2024	26-09-2025	26-09-2026	26-09-2027

Management Systems Division - Director

(tanda tangan fiktif)

Certificate Number: SIM-ITSM-0003 (nomor fiktif)

DOKUMEN SIMULASI UNTUK TUGAS/PEMBELAJARAN. Bukan sertifikat resmi, tidak diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi, dan tidak boleh digunakan untuk tender, klien, atau klaim sertifikasi.

Dipindai dengan CamScanner



CERTIFICATE

Lembaga Sertifikasi Simulasi (Fiktif) - Untuk Keperluan Tugas

This is to certify that the management system of

PT BYTEALL

(Perusahaan Simulasi untuk Tugas)

has been assessed and found to be in compliance with the requirements of

ISO/IEC 25010

Software Product Quality Evaluation

Evaluasi Kualitas Produk Perangkat Lunak

Scope / Ruang Lingkup:

Evaluasi kualitas produk perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan

ISSUE DATE	SURVEILLANCE 1	SURVEILLANCE 2	EXPIRED DATE
26-09-2024	26-09-2025	26-09-2026	26-09-2027

Management Systems Division - Director

(tanda tangan fiktif)

Certificate Number: SIM-SQE-0004 (nomor fiktif)

DOKUMEN SIMULASI UNTUK TUGAS/PEMBELAJARAN. Bukan sertifikat resmi, tidak diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi, dan tidak boleh digunakan untuk tender, klien, atau klaim sertifikasi.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROYEK


A. GAMBARAN UMUM DAN PENGEMBANGAN SISTEM

Aplikasi web manajemen internal Kharismart ini dibangun khusus dengan dukungan basis data MySQL. Sistem ini dirancang secara eksklusif untuk pengguna tunggal (single-user), yaitu Owner yang bertindak sekaligus sebagai Administrator (Admin) dengan cakupan hak akses penuh:


- Kendali Penuh Tunggal (Owner/Admin): Memiliki otorisasi penuh untuk menginput data operasional harian, mengelola entri stok, memperbarui status transaksi internal, melihat dashboard performa, statistik operasional, hingga mengelola ringkasan rekapitulasi laporan secara mandiri.

Guna memberikan gambaran visual mengenai antarmuka pengguna (user interface) sebelum tahap pengkodean dimulai, dirancang alur rancangan wireframe utama untuk sistem tunggal tersebut:

1. Rancangan Wireframe Tampilan Dashboard Utama (Owner/Admin):
    - Header & Sidebar Navigation: Menu navigasi cepat yang mencakup Input Data Harian, Manajemen Stok, Rekapitulasi Transaksi, dan Laporan Performa.
    - Widget Ringkasan Utama (KPIs): Kartu informasi performa yang menampilkan Total Omset Harian/Bulanan, Total Transaksi, dan Grafik Tren Penjualan secara langsung (real-time).
    - Formulir Input Cepat: Panel khusus pada antarmuka utama untuk memudahkan Owner/Admin dalam memasukkan data operasional harian tanpa harus berpindah halaman yang rumit.
2. Rancangan Wireframe Tampilan Manajemen Stok & Transaksi:
    - Tabel Kelola Stok & Transaksi: Daftar persediaan barang dan status transaksi dengan indikator peringatan dini (alert) untuk stok barang yang menipis.
    - Panel Pembaruan Status: Tombol interaktif untuk memperbarui, mengedit, atau memverifikasi status transaksi internal secara cepat dan efisien.

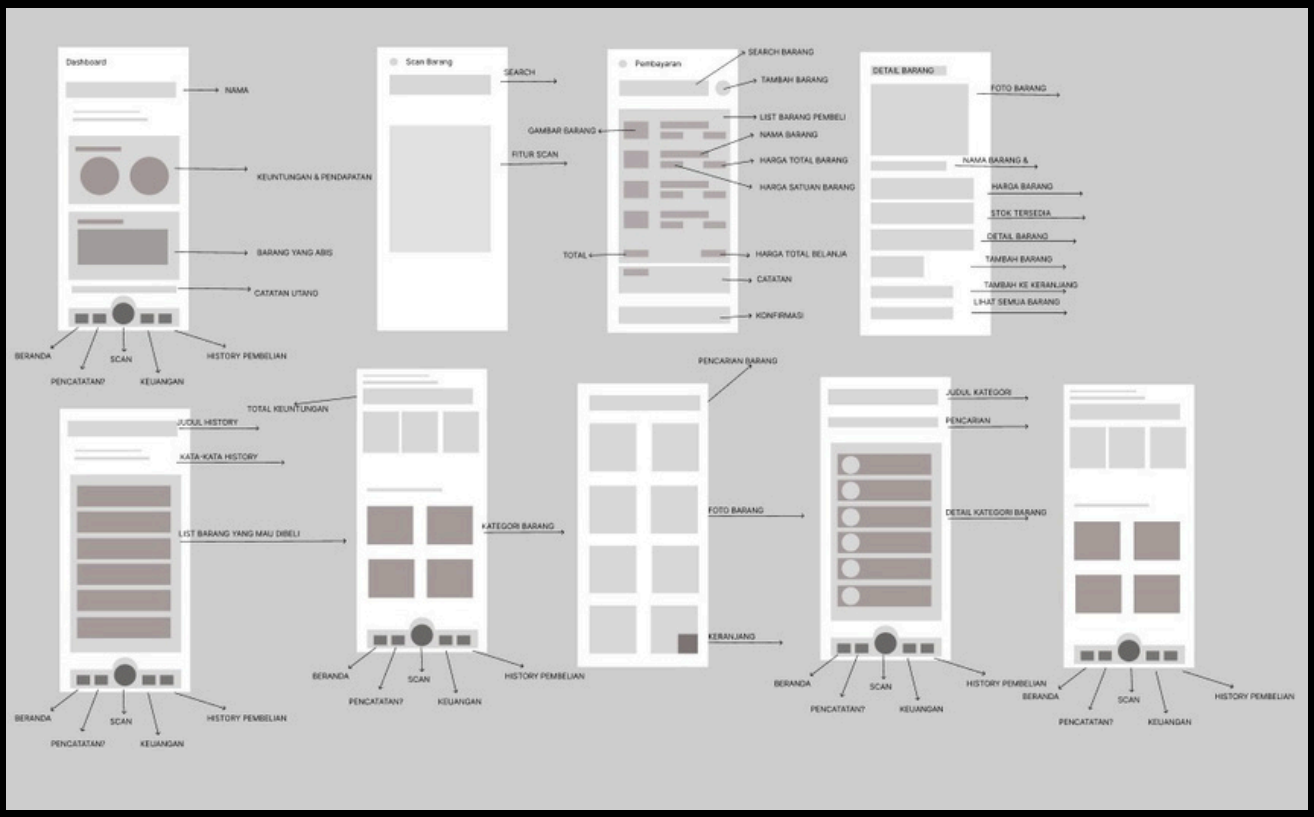

*Gambar Wireframe

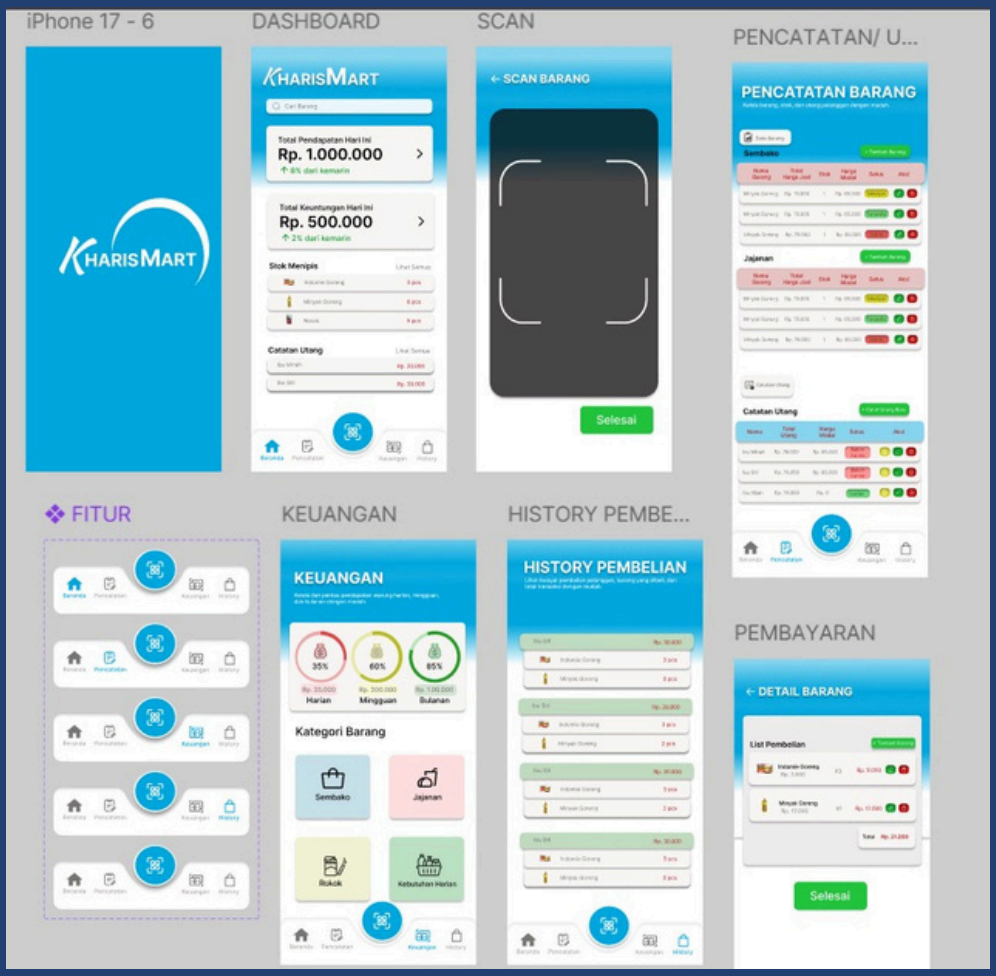

*Gambar Prototype Sementara

B. PENGUJIAN SISTEM

Pengujian dilakukan pada minggu ke-7 menggunakan metode Black-Box Testing dan Single-User Access Testing. Tahap ini memastikan bahwa Owner yang bertindak sebagai Admin dapat menginput data operasional tanpa kendala, seluruh fitur dashboard dan pengelolaan stok menyajikan data akurat, serta fungsi sistem berjalan lancar bebas dari bug (bug-free).

C. MONITORING DAN EVALUASI PROYEK

Monitoring dilakukan secara berkala melalui rapat internal tim serta penyampaian laporan ringkas mingguan kepada Pemilik Kharismart. Evaluasi ini menjamin pengembangan aplikasi tetap berada di jalur yang benar (on schedule dan on budget).

D. SERAH TERIMA PROYEK

Setelah seluruh sistem selesai dikembangkan, diuji, dan dinyatakan lolos uji kelayakan, proyek memasuki tahap serah terima. Tim akan menyerahkan kredensial login utama, file repositori/kode program, basis data, dokumentasi panduan, serta memberikan pelatihan langsung pengoperasian sistem kepada Admin Kharismart.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Proposal penawaran proyek pengembangan aplikasi web manajemen internal Kharismart ini dirancang secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemilik (Owner) yang bertindak langsung sebagai Administrator (Admin) sistem. Dengan estimasi anggaran berbasis bottom-up estimating sebesar Rp12.980.000 (diurutkan terperinci dari tugas terkecil Rp300.000 hingga terbesar Rp5.000.000) serta durasi pengerjaan selama 8 minggu (40 hari kerja), proyek ini siap memberikan solusi digitalisasi internal yang aman, efisien, dan terpusat bagi Kharismart.

B. SARAN

Kami menyarankan agar pihak Kharismart dan tim pengembang segera melakukan finalisasi kesepakatan ruang lingkup internal agar tahapan pengembangan aplikasi web dapat langsung dimulai sesuai dengan lini masa yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 - Quality management systems — Requirements.
- International Organization for Standardization. (2018). ISO/IEC 20000-1:2018 - Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements.
- International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 - Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements.
- International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023 - Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model.
- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.). Project Management Institute.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

BYTEALL COMPANY

www.byteall.com



TERIMA KASIH!

SEMOGA ANDA TERTARIK!

KONTAK KAMI

+123-456-7890

byteall@gmail.com

www.byteall.com

Jakarta Selatan Jl. Imam Bonjol 31
